CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'
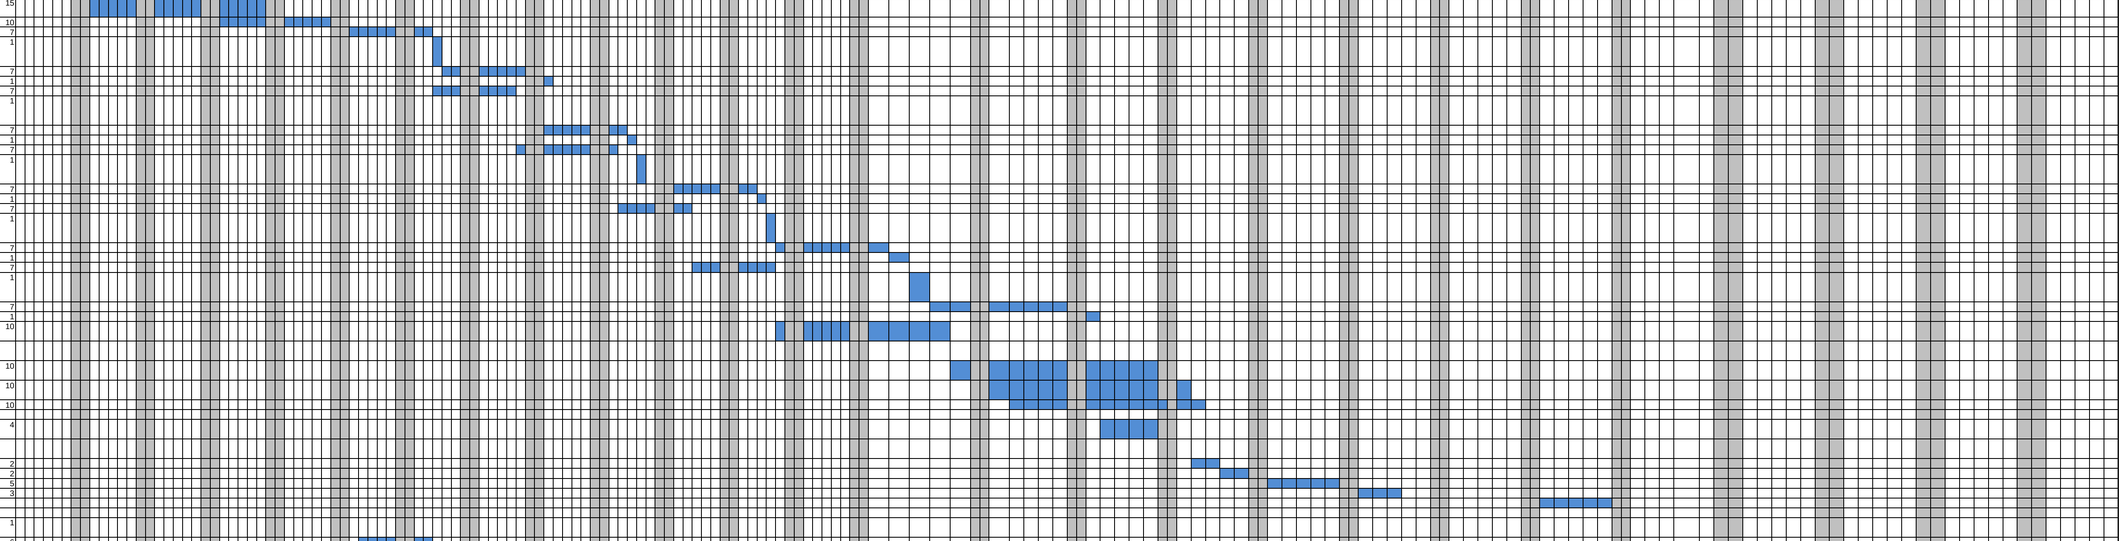
	n°gg
ALLESTIMENTO CANTIERE FISSO	
ALLESTIMENTO CANTIERE	5
REALIZZAZIONE VASCHE DI FITODEPURAZIONE E VOLANO	
MOVIMENTI TERRA E PREPARAZIONE SCAVI VASCHE DI FITODEPURAZIONE	15
REALIZZAZIONE RILEVATO VASCA VOLANO	10
IMPERMEABILIZZAZIONE SCAVO VASCA 1	7
FORNITURA, SALDATURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI DI DRENAGGIO E ALIMENTAZIONE VASCA 1	1
RIEMPIMENTI CON INERTI VASCA 1	7
FORMAZIONE RILEVATO VASCA 1	1
IMPERMEABILIZZAZIONE SCAVO VASCA 4	7
FORNITURA, SALDATURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI DI DRENAGGIO E ALIMENTAZIONE VASCA 4	1
RIEMPIMENTI CON INERTI VASCA 4	7
FORMAZIONE RILEVATO VASCA 4	1
IMPERMEABILIZZAZIONE SCAVO VASCA 2	7
FORNITURA, SALDATURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI DI DRENAGGIO E ALIMENTAZIONE VASCA 2	1
RIEMPIMENTI CON INERTI VASCA 2	7
FORMAZIONE RILEVATO VASCA 2	1
IMPERMEABILIZZAZIONE SCAVO VASCA FWS	7
FORNITURA, SALDATURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI DI DRENAGGIO E ALIMENTAZIONE VASCA FWS	1
RIEMPIMENTI CON INERTI VASCA FWS	7
FORMAZIONE RILEVATO VASCA FWS	1
IMPERMEABILIZZAZIONE SCAVO VASCA 3	7
FORNITURA, SALDATURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI DI DRENAGGIO E ALIMENTAZIONE VASCA 3	1
RIEMPIMENTI CON INERTI VASCA 3	7
FORMAZIONE RILEVATO VASCA 3	1
FORNITURA E POSA IN OPERA POZZETTI DI SERVIZIO	10
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI DI COLLEGAMENTO	
MOVIMENTI TERRA PER LA FORMAZIONE DELLE CANALIZZAZIONI	10
FORNITURA, GIUNZIONE E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI E PEZZI SPECIALI	10
RINFIANCHI TUBAZIONE E RINTERRI	10
OPERE ACCESSORIE	
RIVESTIMENTO CON GEORETE DEL RILEVATO E DELLE SPONDE PERIMETRALI	4
POSA IN OPERA CANALE GRIGLIATURA E DISSABBIATORE	
SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA	2
REALIZZAZIONE IN OPERA DELLE PLATEE	2
POSA DEI MANUFATTI PREFABBRICATI	5
VERNICIATURA CON RESINA EPOSSIDICA	3
RIFINITURE IN OPERA	
MANUFATTO DI RESTITUZIONE	
CREAZIONE RAMPE DI ACCESSO E FORMAZIONE TURE	1
RIPROFILATURA ALVEO	6
TUBAZIONE DI SCARICO	1
PROTEZIONE SPONDALE	6
RIMOZIONE TURE	1
MANUFATTO DI PRESA	
BY-PASS TEMPORANEO	1
DEMOLIZIONE MANUFATTO ESISTENTE	3
REALIZZAZIONE IN OPERA PLATEE	2
REALIZZAZIONE IN OPERA MANUFATTO	5
ACCESSORI	3
PIANTUMAZIONI	5
BOX PREFABBRICATI	4
RECINZIONI E STACCIONATE	3
FORNITURA E POSA IN OPERA COMPONENTI ELETTROMECCANICI	
PARATOIE	2
GRIGLIA	2
QUADRI ELETTRICI	2
MISURATORI DI PORTATA, CAMPIONATORI	2
TOMBATURA BY-PASS SCOLMATORE	1
SMANTELLAMENTO CANTIERE	4
